


Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti



Adresse de l'immeuble
Place Edouard Vasseux
Maison Assistantes Maternelle
60640 GOLANCOURT

Date d'édition du rapport
30/11/2023

Opérateur de repérage
Frédéric SPINELLI

Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre : Non communiquée

SOMMAIRE

■ Désignation de l'immeuble	3
■ Désignation du propriétaire	3
■ Désignation de l'opérateur de repérage	3
■ Réalisation de la mission	3
■ Cadre réglementaire	3
■ Limites du domaine d'application du repérage	4
▶ Programme de travaux du donneur d'ordre	4
▶ Programme et périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage	4
■ Conclusion	4
▶ Récapitulatif des matériaux et produits contenant de l'amiante	4
▶ Locaux ou parties de locaux non visités	6
▶ Composants ou parties de composants qui n'ont pu être inspectés	6
▶ Obligation de transmission du rapport	6
■ Dates de visite et d'établissement du rapport	6
■ Conditions de réalisation du repérage	7
▶ Historique de la mission	7
▶ Programme de repérage réglementaire	7
▶ Modes opératoires	7
▶ Conditions spécifiques du repérage	7
▶ Constatations diverses	7
■ Résultats détaillés du repérage	7
▶ Légende des colonnes des tableaux de matériaux et produits repérés	7
▶ Locaux visités & matériaux et produits repérés	8
▶ Matériaux et produits contenant de l'amiante	14
▶ Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante	16
■ Annexes	21
▶ Estimation de la quantité de MPCA repérés	21
▶ Rapports précédemment réalisés	22
▶ Plans et croquis	22
▶ Rapports d'essais de laboratoire	26
▶ Planche photographique	38
▶ Attestation d'assurance	44
▶ Certifications	44
▶ Attestation d'indépendance	44

DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : **Place Edouard Vasseux
Maison Assistantes Maternelle
60640 GOLANCOURT**

Nature de l'immeuble : **Locaux communaux**

Étendue de la prestation : **Parties Privatives**

Destination des locaux : **Autres bâtiments de culture et de loisirs**

Date du permis de construire : **1948 - 1974**

DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE

Propriétaire : **MAIRIE DE GOLANCOURT – 420 Rue Verte 60640 GOLANCOURT**

Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :

Qualité du donneur d'ordre : **Maître d'oeuvre**

Identification : **ECOBAT HABITAT – C°/ Mr Loic DEGAUCHY**

DÉSIGNATION DE L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Opérateur de repérage : **Frédéric SPINELLI**
Certification n°13-364 délivrée le 23/05/2022 pour 7 ans par Abcidia Certification (102 route de Limours 78470 ST RÉMY LÈS CHEVREUSE) ☒ Avec mention
Formation à la prévention des risques liés à l'amiante conformément à l'arrêté du 23 février 2012

Cabinet de diagnostics : **SAS NEWTON - AGENDA OISE**
BP 10043 - Centre Inovia - Bd Cambronne - 60400 NOYON
N° SIRET : **431 333 673 00058**

Compagnie d'assurance : **AXA** N° de police : **10755853504** Validité : **1er Janvier 2023 au 1er Janvier 2024**

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par l'organisme certificateur mentionné sous le nom de l'opérateur de repérage concerné.

RÉALISATION DE LA MISSION

N° de dossier : **2023-10-1618 #A1**

N° de la version précédente : **Sans objet**

Ordre de mission du : **06/11/2023**

Accompagnateur(s) : **MAIRIE DE GOLANCOURT (Propriétaire)**

Document(s) fourni(s) : **Aucun**

Moyens mis à disposition : **Aucun**

Laboratoire(s) d'analyses : **ITGA RENNES R – Parc Edonia, Bât R - Rue de la Terre Adélie CS 66862 – 35768 ST GREGOIRE CEDEX –
Accréditation n°1-5967**

Commentaires : **Néant**

CADRE RÉGLEMENTAIRE

- Article L4412-2 du Code du Travail : Risques d'exposition à l'amiante – Repérages avant travaux
- Articles R4412-97 à R4412-97-6 du Code du Travail : Évaluation initiale des risques
- Arrêté du 16 juillet 2019 modifié relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
- Norme NF X 46-020 (Août 2017) : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

Nota : Sauf indication contraire, l'ensemble des références légales, réglementaires et normatives s'entendent de la version des textes en vigueur au jour de la réalisation du diagnostic.

LIMITES DU DOMAINE D'APPLICATION DU REPÉRAGE

Le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles doit faire rechercher la présence d'amiante, préalablement à toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs

à l'amiante. La recherche d'amiante est assurée par un repérage préalable à l'opération. Cette obligation vise à permettre à l'entreprise appelée à réaliser l'opération de procéder à son évaluation des risques professionnels, et d'ajuster les protections collectives et individuelles de ses travailleurs.

Le repérage de l'amiante avant réalisation de travaux dans les immeubles bâtis consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement du fait, notamment, de chocs ou de vibrations, par les travaux de retrait ou d'encapsulation d'amiante et les interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante. Le repérage est adapté à la nature de l'opération et à son périmètre, selon le programme de travaux détaillé, comprenant la localisation précise de ces travaux, transmis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage. Le donneur d'ordre transmet sa mise à jour à l'opérateur de repérage en cas de modification des travaux.

Lorsque l'opérateur estime que le repérage est de nature à l'exposer à un risque excessif pour sa sécurité ou sa santé du fait des conditions techniques ou des circonstances dans lesquelles il devrait être réalisé, la mission ne peut être menée à son terme. La protection individuelle et collective des travailleurs est alors assurée comme si la présence de l'amiante était avérée.

Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage au donneur d'ordre, celui-ci fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement de l'opération. L'opérateur de repérage établit alors un pré-rapport à chaque étape d'avancement. Le rapport définitif est établi lorsque tous les composants de la construction concernés par les travaux ont été repérés.

Nota :

- Notre mission consiste à rechercher les matériaux et produits contenant de l'amiante et non ceux qui pourraient être contaminés par de l'amiante.
- L'opérateur de repérage met tout en œuvre pour limiter l'émission de fibres d'amiante lors de ses opérations de sondage et de prélèvement. Néanmoins, il appartient au donneur d'ordre, avant d'autoriser la réoccupation des locaux par les usagers ou les entreprises de travaux, de faire vérifier que la concentration en fibres d'amiante en suspension dans l'air des locaux n'excède pas le seuil réglementaire (5 fibres/litre). S'il y a des travaux de retrait ou de confinement de MPCA (matériaux ou produit contenant de l'amiante), ce contrôle servira de référence avant travaux.
- En cas de travaux de retrait ou d'encapsulation de MPCA, le propriétaire doit faire procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel de l'état des surfaces traitées (*Article R1334-29-3 du Code de la Santé Publique & Article R4412-140 du Code du Travail*).

Programme de travaux du donneur d'ordre

- Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre : Non communiquée

Plan de travaux fourni par le maître d'ouvrage Ecobat Habitat 60200 COMPIEGNE

Programme et périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage

Le repérage des fondations et canalisations enterrées sera réalisé dans un repérage avant-travaux distinct du présent dossier lorsque ces éléments seront accessibles.

CONCLUSION

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport,
il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Récapitulatif des matériaux et produits contenant de l'amiante

Le tableau ci-dessous récapitule les composants de la construction où il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. La liste et la localisation de tous les matériaux et produits repérés sont détaillées dans la suite du document. La quantification des MPCA repérés figure en Annexe.

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation	Méthode	EC	Photo
N°	DÉSIGNATION				
Parois verticales intérieures					
4	Mur(s) B Colle plinthes	Maison Rez de chaussée Entrée	Après analyse		
5	Mur(s) ACD Colle plinthes	Maison Rez de chaussée Entrée	Après analyse		
11	Mur(s) B Colle plinthes	Maison Rez de chaussée Dégagement accès garage	Après analyse		
12	Mur(s) ACD Colle plinthes	Maison Rez de chaussée Dégagement accès garage	Après analyse		
18	Mur(s) B Colle plinthes	Maison Rez de chaussée Rangement sous escalier	Après analyse		
19	Mur(s) ACD Colle plinthes	Maison Rez de chaussée Rangement sous escalier	Après analyse		
39	Mur(s) B Colle plinthes	Maison Rez de chaussée Pièce Principale	Après analyse		
76	Mur(s) B Colle plinthes	Maison 1er étage Cuisine	Après analyse		
77	Mur(s) ACD Colle plinthes	Maison 1er étage Cuisine	Après analyse		
97	Mur(s) B Colle plinthes	Maison 1er étage Salle de bains	Après analyse		
98	Mur(s) ACD Colle plinthes	Maison 1er étage Salle de bains	Après analyse		
112	Mur(s) ACD Colle plinthes	Maison 1er étage WC	Après analyse		
Planchers et planchers techniques					
53	Sol Dalles de sol blanches	Maison 1er étage Palier	Après analyse		
54	Sol Dalles de sol noires	Maison 1er étage Palier	Après analyse		
59	Sol Dalles de sol blanches	Maison 1er étage Pièce Principale	Après analyse		
60	Sol Dalles de sol noires	Maison 1er étage Pièce Principale	Après analyse		
64	Plancher Ciment réagréage	Maison 1er étage Pièce Principale	Après analyse		
65	Plancher Ciment réagréage	Maison 1er étage Palier	Après analyse		
72	Plancher Ciment réagréage	Maison 1er étage Cuisine	Après analyse		
82	Sol Dalles de sol beiges	Maison 1er étage Dégagement	Après analyse		

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation	Méthode	EC	Photo
N°	DÉSIGNATION				
87	Plancher Ciment réagréage	Maison 1er étage Dégagement	Après analyse		
93	Plancher Ciment réagréage	Maison 1er étage Salle de bains	Après analyse		
107	Plancher Ciment réagréage	Maison 1er étage WC	Après analyse		
117	Sol Dalles de sol beiges	Maison 1er étage Chambre 1	Après analyse		
120	Plancher Ciment réagréage	Maison 1er étage Chambre 1	Après analyse		
122	Sol Dalles de sol beiges	Maison 1er étage Chambre 2	Après analyse		
125	Plancher Ciment réagréage	Maison 1er étage Chambre 2	Après analyse		

Méthode : Après analyse = Prélèvement d'un échantillon représentatif du matériau ou produit et analyse par un laboratoire accrédité
Sur décision de l'opérateur = Document consulté (information documentaire sur le matériau ou produit, facture de fourniture et pose du matériau ou produit) / Marquage du matériau ou produit

EC : Cette colonne indique l'état de conservation de chaque matériau ou produit (paramètre non défini réglementairement)
ND : Non dégradé EU : État d'usage D : Dégradé

Locaux ou parties de locaux non visités

Néant

Composants ou parties de composants qui n'ont pu être inspectés

Néant

Obligation de transmission du rapport

Le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage a l'obligation de conserver et de transmettre ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 (cf. § « Cadre réglementaire ») :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DA-PP) prévu au I de l'article R1334-29-4 du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DA-PP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R1334-29-4 du Code de la Santé Publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R1334-29-5 du Code de la Santé Publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

DATES DE VISITE ET D'ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT

Visite effectuée le 15/11/2023

Rapport rédigé à NOYON, le 30/11/2023

Opérateur de repérage : Frédéric SPINELLI

Durée de validité : Non définie par la réglementation

Signature de l'opérateur de repérage



Cachet de l'entreprise



SAS NEWTON - AGENDA OISE

BP 10043 - Centre Inovia - Bd Cambronne -
60400 NOYON

Tél : 03 44 41 01 38

SIRET : 431 333 673 00058 – APE : 741G

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité (annexes comprises), et avec l'accord écrit de son signataire.

CONDITIONS DE RÉALISATION DU REPÉRAGE

Historique de la mission

DATE	Événement	Commentaire
06/11/2023	Signature de l'ordre de mission	
15/11/2023	Repérage sur site	Opérateur : Frédéric SPINELLI
16/11/2023	Envoi des prélèvements pour analyse en laboratoire	
30/11/2023	Edition du rapport de mission de repérage	Dossier N°2023-10-1618 #A1

Programme de repérage réglementaire

Il s'agit de la liste réglementaire de matériaux et produits devant être inspectés : Annexe 1 de de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

Cependant, si l'opérateur repère tout autre matériau ou produit réputé contenir de l'amiante, il doit le prendre en compte au même titre qu'un matériau ou produit de l'Annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019.

Modes opératoires

Nous tenons à votre disposition nos modes opératoires pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante. Ces modes opératoires décrivent la méthodologie propre à nos interventions. Ils permettent notamment de limiter la propagation de fibres d'amiante lors des sondages et prélèvements.

Conditions spécifiques du repérage

Sans conditions

Constatations diverses

Néant

RÉSULTATS DÉTAILLÉS DU REPÉRAGE





Ces résultats sont présentés sous 2 formes :

- « **Locaux visités & matériaux et produits repérés** » :
 - ▶ Les matériaux et produits repérés sont regroupés par local visité, qu'ils contiennent de l'amiante ou pas ;
 - ▶ Leur identification est réalisée grâce à un numéro unique et une désignation en langage courant ;
- « **Matériaux et produits contenant de l'amiante** » et « **Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante** » :
 - ▶ Les matériaux et produits repérés sont regroupés selon le fait qu'ils contiennent ou pas de l'amiante, indépendamment du local où ils se trouvent ;
 - ▶ Leur identification est réalisée grâce à un numéro unique (le même que précédemment, ce qui permet de faire le lien entre les 2 types de présentation des résultats) et leur libellé réglementaire (composant / partie du composant) ;
 - ▶ Le critère ayant permis de conclure à la présence ou à l'absence d'amiante y est précisé :
 - Sur décision de l'opérateur : Document consulté (information documentaire sur le matériau ou produit, facture de fourniture et pose du matériau ou produit), Marquage du matériau ou produit, Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante ;
 - Après analyse : Prélèvement d'un échantillon représentatif du matériau ou produit et analyse par un laboratoire accrédité.

Enfin, la **légende** ci-dessous permet d'expliciter la terminologie et les pictogrammes utilisés dans les tableaux de résultats.

Légende des colonnes des tableaux de matériaux et produits repérés


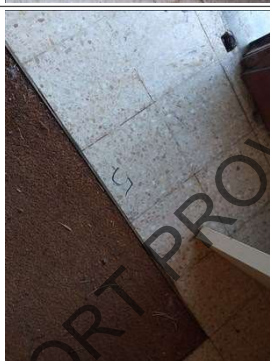






CARACTÉRISTIQUE	Identifiant	Commentaire
Élément de construction	N°	Numéro de l'élément de construction permettant de faire le lien entre sa désignation courante et son libellé réglementaire
	Désignation	Description courante de l'élément de construction







CARACTÉRISTIQUE	Identifiant	Commentaire
	Composant / Partie du composant	Description selon le programme de repérage réglementaire (cf. 'Conditions de réalisation du repérage')
Sondages et prélèvements		Prélèvement (P1 : référence du prélèvement) Si le pictogramme est rouge, alors le matériau est amianté
		Sondage : le recensement des sondages n'a pas vocation à être exhaustif D1 : référence de la décision opérateur ZPSO : zone présentant des similitudes d'ouvrage (se réfère à un prélèvement ou une décision de l'opérateur sur un matériau ou produit de même nature : ce prélèvement ou cette décision de l'opérateur est l'élément témoin de référence de la ZPSO) Si le pictogramme est rouge, alors le matériau est amianté
		Présence d'amiante
		Prélèvement en attente de résultat d'analyse
Paroi	A, B, ..., Z	Murs : le mur A est le mur d'entrée dans la pièce, les lettres suivantes sont affectées aux autres murs en fonction du sens des aiguilles d'une montre
	SO	Sol
	PL	Plafond
État de conservation (EC)	ND	Non dégradé
	EU	État d'usage
	D	Dégradé
Justification		Indication des éléments qui ont permis de conclure à la présence ou à l'absence d'amiante

Locaux visités & matériaux et produits repérés







Les (éventuelles) lignes d'éléments de construction en gras (avec pictogrammes 'a' et prélèvements/sondages en rouge) correspondent à des matériaux ou produits contenant de l'amiante, dont on trouvera le détail dans les rubriques suivantes. Les autres lignes d'éléments de construction correspondent à des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante, dont on trouvera le détail dans les rubriques suivantes, ou n'entrant pas dans le cadre de cette mission.






LOCAL	Élément de construction			Sondages et prélèvements
	N°	Désignation	Photo	
Maison Rez de chaussée Entrée	1	Mur(s) A Enduit Platreux projeté		P1 
	2	Mur(s) BCD Enduit Platreux projeté		ZPSO P1 
	3	Plafond Enduit projeté		P2 
	4	Mur(s) B Colle plinthes		P3  
	5	Mur(s) ACD Colle plinthes		ZPSO P3  

LOCAL	Élément de construction			Sondages et prélèvements
	N°	Désignation	Photo	
	6	Plancher Colle carrelage		P4 ⊗
	7	Plancher Dalle béton		P5 ⊗
Maison Rez de chaussée Dégagement accès garage	8	Mur(s) A Enduit Platreux projeté		ZPSO P1 ⊙
	9	Mur(s) BCD Enduit Platreux projeté		ZPSO P1 ⊙
	10	Plafond Enduit projeté		ZPSO P2 ⊙
	11	Mur(s) B Colle plinthes		ZPSO P3 ⊙ 
	12	Mur(s) ACD Colle plinthes		ZPSO P3 ⊙ 
	13	Plancher Colle carrelage		ZPSO P4 ⊙
	14	Plancher Dalle béton		ZPSO P5 ⊙
Maison Rez de chaussée Rangement sous escalier	15	Mur(s) A Enduit Platreux projeté		ZPSO P1 ⊙
	16	Mur(s) BCD Enduit Platreux projeté		ZPSO P1 ⊙
	17	Plafond Enduit projeté		ZPSO P2 ⊙
	18	Mur(s) B Colle plinthes		ZPSO P3 ⊙ 
	19	Mur(s) ACD Colle plinthes		ZPSO P3 ⊙ 
	20	Plancher Colle carrelage		ZPSO P4 ⊙
	21	Plancher Dalle béton		ZPSO P5 ⊙
Maison Rez de chaussée garage coté chaufferie	22	Conduit(s) de fluide mur A Calorifugeage		P6 ⊗
	23	Conduit(s) de fumées chaufferie A Enduit		P7 ⊗

LOCAL	Élément de construction			Sondages et prélèvements
	N°	Désignation	Photo	
	24	Plancher Dalle béton		P8 ⊗
	129	Conduit(s) de fumées Enduit ciment		P28 ⊗
Maison Rez de chaussée Local adjacent garage	27	Plancher Dalle béton		ZPSO P8 ⊕
	28	Conduit(s) de fluide mur A Calorifugeage blanc		P9 ⊗
Maison Rez de chaussée Montée d'escalier	29	Mur(s) A Enduit Platreux projeté		ZPSO P1 ⊕
	30	Mur(s) BCD Enduit Platreux projeté		ZPSO P1 ⊕
	31	Plafond Enduit projeté		ZPSO P2 ⊕
	32	Mur(s) C Colle plinthes		P10 ⊗
	33	Mur(s) ABD Colle plinthes		ZPSO P10 ⊕
Maison Rez de chaussée Pièce Principale	35	Plancher Dalle béton		ZPSO P5 ⊕
	37	Mur(s) BCD Enduit Platreux projeté		ZPSO P1 ⊕
	38	Plafond Enduit projeté		ZPSO P2 ⊕
	39	Mur(s) B Colle plinthes		ZPSO P3 ⊕ 
	41	Plancher Colle carrelage		ZPSO P4 ⊕
	42	Plancher Dalle béton		ZPSO P5 ⊕
	43	Mur(s) e Bande calicot		P11 ⊗
Maison Rez de chaussée Local ECS	45	Mur(s) BCD Enduit Platreux projeté		ZPSO P1 ⊕
	46	Plafond Enduit projeté		ZPSO P2 ⊕
	50	Plancher Dalle béton		ZPSO P5 ⊕

LOCAL	Élément de construction			Sondages et prélèvements
	N°	Désignation	Photo	
Maison Rez de chaussée EXTERIEUR HABITATION	51	Mur(s) C Enduit rebouchage		P12 ⊗
	127	Façade avant Enduit projeté		P27 ⊗
	128	Façade droite Enduit projeté		ZPSO P27 ⊕
Maison 1er étage Palier	52	Sol Colle grise et blanche fixation barre de seuil		P13 ⊗
	53	Sol Dalles de sol blanches		P14 ⊗ a
	54	Sol Dalles de sol noires		P15 ⊗ a
	55	Mur(s) A Enduit Platreux projeté		P16 ⊗
	56	Mur(s) BCD Enduit Platreux projeté		ZPSO P16 ⊕
	57	Plafond Joint calicot		ZPSO P11 ⊕
	65	Plancher Ciment réagréage		ZPSO P17 ⊕ a
Maison 1er étage Pièce Principale	59	Sol Dalles de sol blanches		ZPSO P14 ⊕ a
	60	Sol Dalles de sol noires		ZPSO P15 ⊕ a
	62	Mur(s) BCD Enduit Platreux projeté		ZPSO P16 ⊕

LOCAL	Élément de construction			Sondages et prélèvements
	N°	Désignation	Photo	
	63	Plafond Joint calicot		ZPSO P11 ⊕
	64	Plancher Ciment réagréage		P17 ⊗ a
	130	Mur(s) B Enduit		P29 ⊗
	131	Mur(s) CD Enduit		ZPSO P29 ⊕
Maison 1er étage Cuisine	66	Sol Colle grise et blanche fixation barre de seuil		ZPSO P13 ⊕
	69	Mur(s) A Enduit Platreux projeté		ZPSO P16 ⊕
	70	Mur(s) BCD Enduit Platreux projeté		ZPSO P16 ⊕
	71	Plafond Joint calicot		ZPSO P11 ⊕
	72	Plancher Ciment réagréage		ZPSO P17 ⊕ a
	73	Plancher Colle carrelage		P18 ⊗
	74	Mur(s) C Colle faïence		P19 ⊗
	75	Mur(s) D Colle faïence		ZPSO P19 ⊕
	76	Mur(s) B Colle plinthes		P20 ⊗ a
	77	Mur(s) ACD Colle plinthes		ZPSO P20 ⊕ a
	78	Mur(s) C Joint silicone		P21 ⊗
	79	Mur(s) CE Joint silicone		ZPSO P21 ⊕

LOCAL	Élément de construction			Sondages et prélèvements
	N°	Désignation	Photo	
Maison 1er étage Dégagement	80	Plafond Colle dalles		P22 ⊗
	81	Sol Colle grise et blanche fixation barre de seuil		ZPSO P13 ⊙
	82	Sol Dalles de sol beiges		P23 ⊗ a
	85	Mur(s) BCD Enduit Platreux projeté		ZPSO P16 ⊙
	86	Plafond Joint calicot		ZPSO P11 ⊙
	87	Plancher Ciment réagréage		ZPSO P17 ⊙ a
Maison 1er étage Salle de bains	88	Plafond Colle dalles		P24 ⊗
	89	Sol Colle grise et blanche fixation barre de seuil		ZPSO P13 ⊙
	91	Mur(s) BCD Enduit Platreux projeté		ZPSO P16 ⊙
	92	Plafond Joint calicot		ZPSO P11 ⊙
	93	Plancher Ciment réagréage		ZPSO P17 ⊙ a
	94	Plancher Colle carrelage		ZPSO P18 ⊙
	96	Mur(s) B Colle faïence		P25 ⊗
	97	Mur(s) B Colle plinthes		ZPSO P20 ⊙ a
	98	Mur(s) ACD Colle plinthes		ZPSO P20 ⊙ a
	99	Mur(s) D Joint silicone		P26 ⊗
Maison 1er étage WC	101	Plafond Colle dalles		ZPSO P22 ⊙
	102	Mur(s) BCD Colle faïence		ZPSO P25 ⊙
	103	Sol Colle grise et blanche fixation barre de seuil		ZPSO P13 ⊙
	105	Mur(s) BCD Enduit Platreux projeté		ZPSO P16 ⊙
	106	Plafond Joint calicot		ZPSO P11 ⊙

LOCAL	Élément de construction			Sondages et prélèvements
	N°	Désignation	Photo	
	107	Plancher Ciment réagréage		ZPSO P17  
	108	Plancher Colle carrelage		ZPSO P18 
	112	Mur(s) ACD Colle plinthes		ZPSO P20  
	115	Plafond Colle dalles		ZPSO P22 
Maison 1er étage Chambre 1	117	Sol Dalles de sol beiges		ZPSO P23  
	118	Mur(s) BCD Enduit Platreux projeté		ZPSO P16 
	119	Plafond Joint calicot		ZPSO P11 
	120	Plancher Ciment réagréage		ZPSO P17  
	121	Plafond Colle dalles		ZPSO P24 
Maison 1er étage Chambre 2	122	Sol Dalles de sol beiges		ZPSO P23  
	123	Mur(s) BCD Enduit Platreux projeté		ZPSO P16 
	124	Plafond Joint calicot		ZPSO P11 
	125	Plancher Ciment réagréage		ZPSO P17  
	126	Plafond Colle dalles		ZPSO P24 
Maison 2ème étage Combles Sous pentes de toiture	132	Conduit(s) Enduit ciment		P30 

Matériaux et produits contenant de l'amiante

Cette rubrique permet de faire le lien entre les matériaux et produits amiantés repérés ci-dessus à la rubrique « Locaux visités & matériaux et produits repérés » et la terminologie réglementaire rappelée à la rubrique « Programme de repérage réglementaire ». La correspondance s'établit grâce au N° d'élément de construction.

SUR DÉCISION DE L'OPÉRATEUR

Néant

APRÈS ANALYSE

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation	Prélèvement			EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE		Local	Paroi	ZPSO	Réf.	
4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle des plinthes faïence	Maison Rez de chaussée Entrée	B			P3	ND
5	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle des plinthes faïence	Maison Rez de chaussée Entrée	ACD	X		P3	ND
11	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle des plinthes faïence	Maison Rez de chaussée Dégagement accès garage	B	X		P3	ND
12	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle des plinthes faïence	Maison Rez de chaussée Dégagement accès garage	ACD	X		P3	ND

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation	Prélèvement			EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi	ZPSO	Réf.		
18	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle des plinthes faïence	Maison Rez de chaussée Rangement sous escalier	B	X	P3	ND	
19	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle des plinthes faïence	Maison Rez de chaussée Rangement sous escalier	ACD	X	P3	ND	
39	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle des plinthes faïence	Maison Rez de chaussée Pièce Principale	ABC DEF	X	P3	ND	
53	Revêtements de sols / Dalles de sol	Maison 1er étage Palier	SO		P14	ND	
54	Revêtements de sols / Dalles de sol	Maison 1er étage Palier	SO		P15	ND	
59	Revêtements de sols / Dalles de sol	Maison 1er étage Pièce Principale	SO	X	P14	ND	
60	Revêtements de sols / Dalles de sol	Maison 1er étage Pièce Principale	SO	X	P15	ND	
64	Revêtements de sols / Sols coulés à base ciment (terrazolith...)	Maison 1er étage Pièce Principale	SO		P17	ND	
65	Revêtements de sols / Sols coulés à base ciment (terrazolith...)	Maison 1er étage Palier	SO	X	P17	ND	
72	Revêtements de sols / Sols coulés à base ciment (terrazolith...)	Maison 1er étage Cuisine	SO	X	P17	ND	
76	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle plinthes	Maison 1er étage Cuisine	B		P20	ND	
77	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle plinthes	Maison 1er étage Cuisine	ACD	X	P20	ND	
82	Revêtements de sols / Dalles de sol	Maison 1er étage Dégagement	SO		P23	ND	
87	Revêtements de sols / Sols coulés à base ciment (terrazolith...)	Maison 1er étage Dégagement	SO	X	P17	ND	
93	Revêtements de sols / Sols coulés à base ciment (terrazolith...)	Maison 1er étage Salle de bains	SO	X	P17	ND	
97	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle plinthes	Maison 1er étage Salle de bains	B	X	P20	ND	
98	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle plinthes	Maison 1er étage Salle de bains	ACD	X	P20	ND	

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation	Prélèvement			EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi	ZPSO	Réf.		
107	Revêtements de sols / Sols coulés à base ciment (terrazolith...)	Maison 1er étage WC	SO	X	P17	ND	
112	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle plinthes	Maison 1er étage WC	ACD	X	P20	ND	
117	Revêtements de sols / Dalles de sol	Maison 1er étage Chambre 1	SO	X	P23	ND	
120	Revêtements de sols / Sols coulés à base ciment (terrazolith...)	Maison 1er étage Chambre 1	SO	X	P17	ND	
122	Revêtements de sols / Dalles de sol	Maison 1er étage Chambre 2	SO	X	P23	ND	
125	Revêtements de sols / Sols coulés à base ciment (terrazolith...)	Maison 1er étage Chambre 2	SO	X	P17	ND	





Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante

Cette rubrique permet de faire le lien entre les matériaux et produits non amiantés repérés ci-dessus à la rubrique « Locaux visités & matériaux et produits repérés » et la terminologie réglementaire rappelée à la rubrique « Programme de repérage réglementaire ». La correspondance s'établit grâce au N° d'élément de construction.

SUR DÉCISION DE L'OPÉRATEUR



Néant

APRÈS ANALYSE

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation	Prélèvement			EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi	ZPSO	Réf.		
1	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison Rez de chaussée Entrée	A		P1		
2	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison Rez de chaussée Entrée	BCD	X	P1		
3	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison Rez de chaussée Entrée	PL		P2		
6	Revêtements de sols / Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Maison Rez de chaussée Entrée	SO		P4		
7	Revêtements de sols / Dalle béton	Maison Rez de chaussée Entrée	SO		P5		

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation	Prélèvement			EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi	ZPSO	Réf.		
8	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison Rez de chaussée Dégagement accès garage	A	X	P1		
9	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison Rez de chaussée Dégagement accès garage	BCD	X	P1		
10	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison Rez de chaussée Dégagement accès garage	PL	X	P2		
13	Revêtements de sols / Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Maison Rez de chaussée Dégagement accès garage	SO	X	P4		
14	Revêtements de sols / Dalle béton	Maison Rez de chaussée Dégagement accès garage	SO	X	P5		
15	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison Rez de chaussée Rangement sous escalier	A	X	P1		
16	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison Rez de chaussée Rangement sous escalier	BCD	X	P1		
17	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison Rez de chaussée Rangement sous escalier	PL	X	P2		
20	Revêtements de sols / Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Maison Rez de chaussée Rangement sous escalier	SO	X	P4		
21	Revêtements de sols / Dalle béton	Maison Rez de chaussée Rangement sous escalier	SO	X	P5		
22	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)	Maison Rez de chaussée garage coté chaufferie	A		P6		
23	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides	Maison Rez de chaussée garage coté chaufferie	A		P7		
24	Revêtements de sols / Dalle béton	Maison Rez de chaussée garage coté chaufferie	SO		P8		
27	Revêtements de sols / Dalle béton	Maison Rez de chaussée Local adjacent garage	SO	X	P8		
28	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)	Maison Rez de chaussée Local adjacent garage	A		P9		
29	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison Rez de chaussée Montée d'escalier	A	X	P1		

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation	Prélèvement			EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi	ZPSO	Réf.		
30	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison Rez de chaussée Montée d'escalier	BCD	X	P1		
31	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison Rez de chaussée Montée d'escalier	PL	X	P2		
32	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle limon faïence	Maison Rez de chaussée Montée d'escalier	B		P10		
33	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle limon faïence	Maison Rez de chaussée Montée d'escalier	ACD	X	P10		
35	Revêtements de sols / Dalle béton	Maison Rez de chaussée Montée d'escalier	SO	X	P5		
37	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison Rez de chaussée Pièce Principale	ABC DEF	X	P1		
38	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison Rez de chaussée Pièce Principale	PL	X	P2		
41	Revêtements de sols / Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Maison Rez de chaussée Pièce Principale	SO	X	P4		
42	Revêtements de sols / Dalle béton	Maison Rez de chaussée Pièce Principale	SO	X	P5		
43	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Bandes calicot	Maison Rez de chaussée Pièce Principale	E		P11		
45	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison Rez de chaussée Local ECS	ABC D	X	P1		
46	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison Rez de chaussée Local ECS	PL	X	P2		
50	Revêtements de sols / Dalle béton	Maison Rez de chaussée Local ECS	SO	X	P5		
51	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison Rez de chaussée Local ECS	C		P12		
52	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses	Maison 1er étage Palier	SO		P13		

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation	Prélèvement			EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi	ZPSO	Réf.		
55	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison 1er étage Palier	A		P16		
56	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison 1er étage Palier	BCD	X	P16		
57	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Bandes calicot	Maison 1er étage Palier	PL	X	P11		
62	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison 1er étage Pièce Principale	ABD EFG H	X	P16		
63	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Bandes calicot	Maison 1er étage Pièce Principale	PL	X	P11		
66	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses	Maison 1er étage Cuisine	SO	X	P13		
69	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison 1er étage Cuisine	A	X	P16		
70	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison 1er étage Cuisine	BCD	X	P16		
71	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Bandes calicot	Maison 1er étage Cuisine	PL	X	P11		
73	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses	Maison 1er étage Cuisine	SO		P18		
74	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Maison 1er étage Cuisine	C		P19		
75	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Maison 1er étage Cuisine	D	X	P19		
78	Evier / Joint silicone	Maison 1er étage Cuisine	D		P21		
79	Evier / Joint silicone	Maison 1er étage Cuisine	CE	X	P21		
80	Revetement / Colle dalles	Maison 1er étage Cuisine	PL		P22		
81	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses	Maison 1er étage Dégagement	SO	X	P13		

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation	Prélèvement			EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi	ZPSO	Réf.		
85	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison 1er étage Dégagement	ABC DEF	X	P16		
86	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Bandes calicot	Maison 1er étage Dégagement	PL	X	P11		
88	Revêtement / Colle dalles	Maison 1er étage Dégagement	PL		P24		
89	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses	Maison 1er étage Salle de bains	SO	X	P13		
91	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison 1er étage Salle de bains	ABC D	X	P16		
92	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Bandes calicot	Maison 1er étage Salle de bains	PL	X	P11		
94	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses	Maison 1er étage Salle de bains	SO	X	P18		
96	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle faïence	Maison 1er étage Salle de bains	B		P25		
99	Lavabo / Joint silicone	Maison 1er étage Salle de bains	D		P26		
101	Revetement / Colle dalles	Maison 1er étage Salle de bains	PL	X	P22		
102	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle faïence	Maison 1er étage Salle de bains	CD	X	P25		
103	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses	Maison 1er étage WC	SO	X	P13		
105	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison 1er étage WC	ABC D	X	P16		
106	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Bandes calicot	Maison 1er étage WC	PL	X	P11		
108	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses	Maison 1er étage WC	SO	X	P18		
115	Revetement / Colle dalles	Maison 1er étage WC	PL	X	P22		
118	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison 1er étage Chambre 1	ABC D	X	P16		
119	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Bandes calicot	Maison 1er étage Chambre 1	PL	X	P11		
121	Revêtement / Colle dalles	Maison 1er étage Chambre 1	PL	X	P24		

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation	Prélèvement			EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE		Local	Paroi	ZPSO	Réf.	
123	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison 1er étage Chambre 2	ABC D	X	P16		
124	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Bandes calicot	Maison 1er étage Chambre 2	PL	X	P11		
126	Revêtement / Colle dalles	Maison 1er étage Chambre 2	PL	X	P24		
127	Façades lourdes y compris poteaux / Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	Maison Rez de chaussée EXTERIEUR HABITATION	Faça de ava		P27		
128	Façades lourdes y compris poteaux / Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	Maison Rez de chaussée EXTERIEUR HABITATION	Faça de dro	X	P27		
129	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Enduit	Maison Rez de chaussée garage coté chaufferie	Con duit		P28		
130	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison 1er étage Pièce Principale	B		P29		
131	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison 1er étage Pièce Principale	CD	X	P29		
132	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Enduit ciment	Maison 2ème étage Combles pentes de toiture	Sous Con duit		P30		

ANNEXES

Estimation de la quantité de MPCA repérés

Cette quantification des MPCA (matériaux ou produit contenant de l'amiante) est une estimation établie sur la base des sondages et prélèvements réalisés. Elle est donnée à titre indicatif, dans l'unité appropriée (quantité d'œuvre) : ml (mètres linéaires), m² (mètres carrés), u (unités) ou t (tonnes).

Il ne s'agit pas d'une évaluation des quantités prévisibles de déchets amiantés : lorsque l'opérateur de repérage intervient, il ne peut pas connaître le ou les processus qui seront mis en œuvre par les entreprises intervenant ultérieurement, d'autant plus que celles-ci ne sont pas encore choisies, ni ce que leur mise en œuvre générera comme déchets. Cette estimation ne peut servir de base contractuelle à l'élaboration d'un devis de désamiantage.

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation	EC	Quantité	Commentaire
N°	DÉSIGNATION				
Parois verticales intérieures					
4	Mur(s) B Colle plinthes	Maison Rez de chaussée Entrée		25 ml	
11	Mur(s) B Colle plinthes	Maison Rez de chaussée Dégagement accès garage		25 ml	

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation	EC	Quantité	Commentaire
N°	DÉSIGNATION				
18	Mur(s) B Colle plinthes	Maison Rez de chaussée Rangement sous escalier		25 ml	
39	Mur(s) B Colle plinthes	Maison Rez de chaussée Pièce Principale		25 ml	
76	Mur(s) B Colle plinthes	Maison 1er étage Cuisine		10 ml	
97	Mur(s) B Colle plinthes	Maison 1er étage Salle de bains		10 ml	
Planchers et planchers techniques					
53	Sol Dalles de sol blanches	Maison 1er étage Palier		40 m ²	
54	Sol Dalles de sol noires	Maison 1er étage Palier		40 m ²	
60	Sol Dalles de sol noires	Maison 1er étage Pièce Principale		40 m ²	
82	Sol Dalles de sol beiges	Maison 1er étage Dégagement		7 m ²	
117	Sol Dalles de sol beiges	Maison 1er étage Chambre 1		7 m ²	
122	Sol Dalles de sol beiges	Maison 1er étage Chambre 2		7 m ²	
64	Plancher Ciment réagréage	Maison 1er étage Pièce Principale		80 m ²	

EC : Cette colonne indique l'état de conservation de chaque matériau ou produit (paramètre non défini réglementairement)

ND : Non dégradé

EU : État d'usage

D : Dégradé

MODALITÉS D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination :

- **Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante** : déchets générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, tels que les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité, les déchets de terres naturellement amiantifères et les déchets d'agréats d'enrobés bitumineux amiantés ;
 - ▶ Ces déchets peuvent être stockés dans des installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) : voir Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;
- **Tous les autres déchets d'amiante**, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés ;
 - ▶ Ces déchets doivent être éliminés vers des installations de stockage des déchets dangereux (ISDD) ou vitrifiés (inertage) : voir Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux.

Aucun déchet amianté ne peut être admis dans les installations de stockage de déchets inertes (ISDI).

Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès des Préfectures, des Conseils départementaux, des Mairies, des DREAL et de l'ADEME (consulter le site [Sinœ Déchets](#)).

Rapports précédemment réalisés

Néant

Plans et croquis

- Planche 1/3 : Maison - Rez de chaussée
- Planche 2/3 : Maison - 1er étage
- Planche 3/3 : Maison - 2ème étage

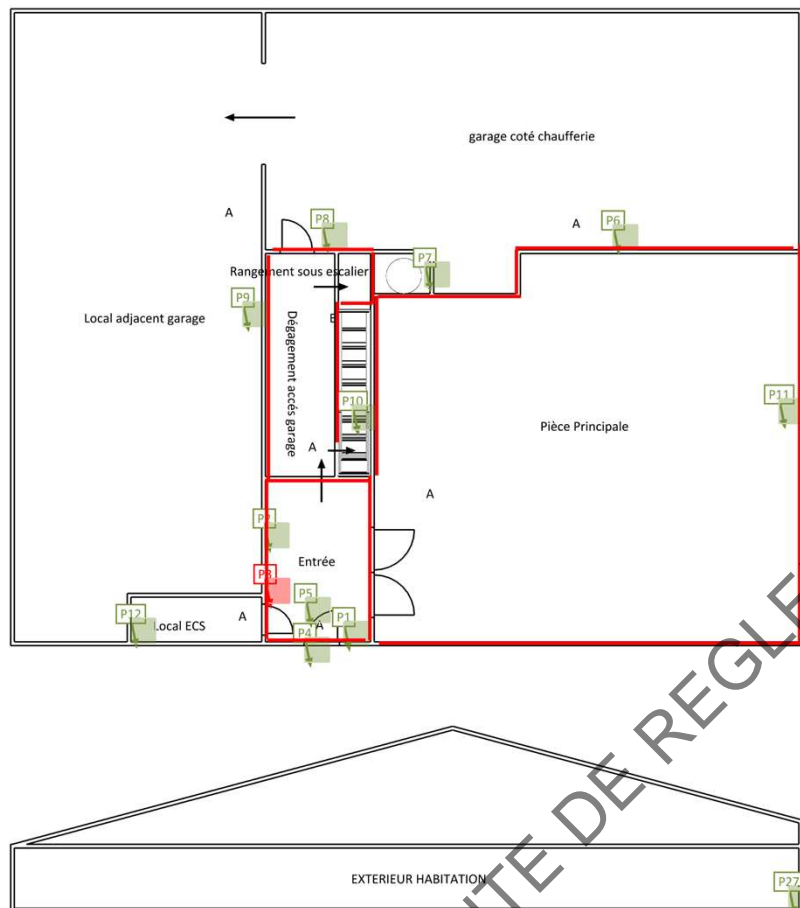


PLANCHE DE REPÉRAGE USUEL

N° dossier : 2023-10-1618 #A1 N° planche : 1/3

Type : Croquis Version : 1

Origine du plan : Cabinet de diagnostic

Place Edouard Vasseux

Adresse immeuble : Maison Assistantes Maternelle
60640 GOLANCOURT

Bâtiment – Niveau : Maison - Rez de chaussée

Document sans échelle remis à titre indicatif

MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Réf.	Désignation	Localisation
P3	Mur(s) B Colle plinthes	Entrée

MATÉRIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

Réf.	Désignation	Localisation
P1	Mur(s) A Enduit Platreux projeté	Entrée
P2	Plafond Enduit projeté	Entrée
P4	Plancher Colle carrelage	Entrée
P5	Plancher Dalle béton	Entrée
P6	Conduit(s) de fluide mur A Calorifugeage	garage coté chaufferie
P7	Conduit(s) de fumées chaufferie A Enduit	garage coté chaufferie
P8	Plancher Dalle béton	garage coté chaufferie
P9	Conduit(s) de fluide mur A Calorifugeage blanc	Local adjacent garage
P10	Mur(s) C Colle plinthes	Montée d'escalier
P11	Mur(s) e Bande calicot	Pièce Principale
P12	Mur(s) C Enduit rebouchage	Local ECS
P27	Façade avant Enduit projeté	EXTERIEUR HABITATION



Local non visité



Investigation approfondie à réaliser

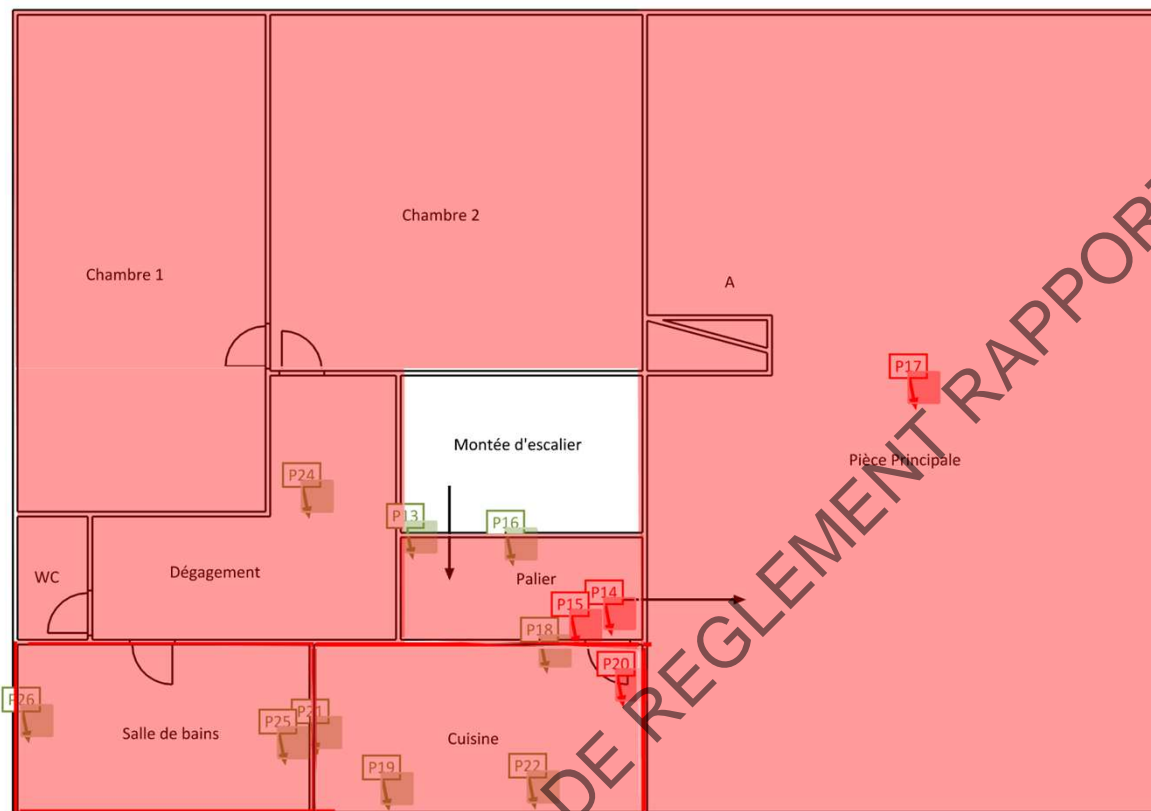


PLANCHE DE REPÉRAGE USUEL

N° dossier : 2023-10-1618 #A1	N° planche : 2/3
Type : Croquis	Version : 1
Origine du plan : Cabinet de diagnostic	
Place Edouard Vasseux	
Adresse immeuble : Maison Assistantes Maternelle	
60640 GOLANCOURT	
Bâtiment – Niveau : Maison - 1er étage	

Document sans échelle remis à titre indicatif

MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Réf.	Désignation	Localisation
P14	Sol Dalles de sol blanches	Palier
P15	Sol Dalles de sol noires	Palier
P17	Plancher Ciment réagréage	Pièce Principale
P20	Mur(s) B Colle plinthes	Cuisine

MATÉRIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

Réf.	Désignation	Localisation
P13	Sol Colle grise et blanche fixation barre de seuil	Palier
P16	Mur(s) A Enduit Platreux projeté	Palier
P18	Plancher Colle carrelage	Cuisine
P19	Mur(s) C Colle faïence	Cuisine
P21	Mur(s) C Joint silicone	Cuisine
P22	Plafond Colle dalles	Cuisine
P24	Plafond Colle dalles	Dégagement
P25	Mur(s) B Colle faïence	Salle de bains
P26	Mur(s) D Joint silicone	Salle de bains



Local non visité



Investigation approfondie à réaliser

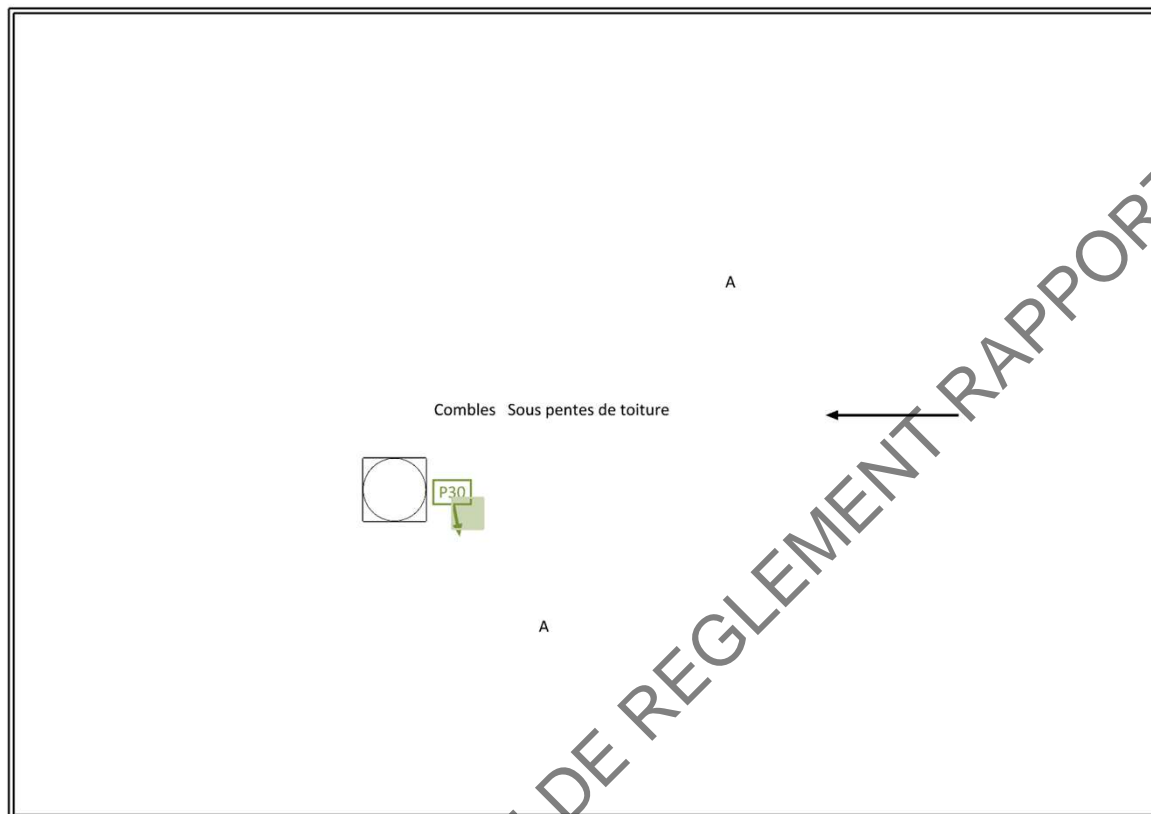




PLANCHE DE REPÉRAGE USUEL	
N° dossier : 2023-10-1618 #A1	N° planche : 3/3
Type : Croquis	Version : 1
Origine du plan : Cabinet de diagnostic	
Adresse immeuble : Maison Assistantes Maternelle 60640 GOLANCOURT	
Bâtiment – Niveau : Maison - 2ème étage	

Document sans échelle remis à titre indicatif









MATÉRIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE		
Réf.	Désignation	Localisation
P30	Conduit(s) Enduit ciment	Combles Sous pentes de toiture










	Local non visité		Investigation approfondie à réaliser
---	------------------	---	--------------------------------------

Rapports d'essais de laboratoire




FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION DES PRÉLÈVEMENTS

Cette fiche récapitule les caractéristiques des prélèvements effectués.

Réf.	Date	Localisation	Élément de construction		Amianté	Photo
			N°	Désignation		
P1	15/11/2023	Maison Rez de chaussée Entrée	1	Mur(s) A Enduit Platreux projeté	Non	
	<u>Commentaires</u> : Néant					
P2	15/11/2023	Maison Rez de chaussée Entrée	3	Plafond Enduit projeté	Non	
	<u>Commentaires</u> : Néant					
P3	15/11/2023	Maison Rez de chaussée Entrée	4	Mur(s) B Colle plinthes	OUI	
	<u>Commentaires</u> : Néant					
P4	15/11/2023	Maison Rez de chaussée Entrée	6	Plancher Colle carrelage	Non	
	<u>Commentaires</u> : Néant					
P5	15/11/2023	Maison Rez de chaussée Entrée	7	Plancher Dalle béton	Non	
	<u>Commentaires</u> : Néant					
P6	15/11/2023	Maison Rez de chaussée garage coté chaufferie	22	Conduit(s) de fluide mur A Calorifugeage	Non	
	<u>Commentaires</u> : Néant					
P7	15/11/2023	Maison Rez de chaussée garage coté chaufferie	23	Conduit(s) de fumées chaufferie A Enduit	Non	
	<u>Commentaires</u> : Néant					
P8	15/11/2023	Maison Rez de chaussée garage coté chaufferie	24	Plancher Dalle béton	Non	
	<u>Commentaires</u> : Néant					

Réf.	Date	Localisation	Élément de construction		Amianté	Photo
			N°	Désignation		
P9	15/11/2023	Maison Rez de chaussée Local adjacent garage	28	Conduit(s) de fluide mur A Calorifugeage blanc	Non	
	<u>Commentaires</u> : Néant					
P10	15/11/2023	Maison Rez de chaussée Montée d'escalier	32	Mur(s) C Colle plinthes	Non	
	<u>Commentaires</u> : Néant					
P11	15/11/2023	Maison Rez de chaussée Pièce Principale	43	Mur(s) e Bande calicot	Non	
	<u>Commentaires</u> : Néant					
P12	15/11/2023	Maison Rez de chaussée Local ECS	51	Mur(s) C Enduit rebouchage	Non	
	<u>Commentaires</u> : Néant					
P13	15/11/2023	Maison 1er étage Palier	52	Sol Colle grise et blanche fixation barre de seuil	Non	
	<u>Commentaires</u> : Néant					
P14	15/11/2023	Maison 1er étage Palier	53	Sol Dalles de sol blanches	OUI	
	<u>Commentaires</u> : Néant					
P15	15/11/2023	Maison 1er étage Palier	54	Sol Dalles de sol noires	OUI	
	<u>Commentaires</u> : Néant					
P16	15/11/2023	Maison 1er étage Palier	55	Mur(s) A Enduit Plâtreux projeté	Non	
	<u>Commentaires</u> : Néant					
P17	15/11/2023	Maison 1er étage Pièce Principale	64	Plancher Ciment réagréage	OUI	
	<u>Commentaires</u> : Néant					

Réf.	Date	Localisation	Élément de construction		Amianté	Photo
			N°	Désignation		
P18	15/11/2023	Maison 1er étage Cuisine	73	Plancher Colle carrelage	Non	
	<u>Commentaires</u> : Néant					
P19	15/11/2023	Maison 1er étage Cuisine	74	Mur(s) C Colle faïence	Non	
	<u>Commentaires</u> : Néant					
P20	15/11/2023	Maison 1er étage Cuisine	76	Mur(s) B Colle plinthes	OUI	
	<u>Commentaires</u> : Néant					
P21	15/11/2023	Maison 1er étage Cuisine	78	Mur(s) C Joint silicone	Non	
	<u>Commentaires</u> : Néant					
P22	15/11/2023	Maison 1er étage Cuisine	80	Plafond Colle dalles	Non	
	<u>Commentaires</u> : Néant					
P23	15/11/2023	Maison 1er étage Dégagement	82	Sol Dalles de sol beiges	OUI	
	<u>Commentaires</u> : Néant					
P24	15/11/2023	Maison 1er étage Dégagement	88	Plafond Colle dalles	Non	
	<u>Commentaires</u> : Néant					
P25	15/11/2023	Maison 1er étage Salle de bains	96	Mur(s) B Colle faïence	Non	
	<u>Commentaires</u> : Néant					
P26	15/11/2023	Maison 1er étage Salle de bains	99	Mur(s) D Joint silicone	Non	
	<u>Commentaires</u> : Néant					
P27	15/11/2023	Maison Rez de chaussée EXTERIEUR HABITATION	127	Façade avant Enduit projeté	Non	
	<u>Commentaires</u> : Néant					

Réf.	Date	Localisation	Élément de construction		Amianté	Photo
			N°	Désignation		
P28	15/11/2023	Maison Rez de chaussée garage coté chaufferie	129	Conduit(s) de fumées Enduit ciment	Non	
	<u>Commentaires</u> : Néant					
P29	15/11/2023	Maison 1er étage Pièce Principale	130	Mur(s) B Enduit	Non	
	<u>Commentaires</u> : Néant					
P30	15/11/2023	Maison 2ème étage Combles Sous pentes de toiture	132	Conduit(s) Enduit ciment	Non	
	<u>Commentaires</u> : Néant					

Amianté = ? : En attente de résultats d'analyse

RAPPORT ANALYSE



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr


L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0223-27733 EN DATE DU 23/11/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : NEWTON Cabinet Agenda - Centre Inovia 1435, Boulevard Cambronne 60400 NOYON	Réf. Commande ITGA : IT0223-27733 Réf. Commande Client : RT012 20231116 084203
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 20/11/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT Réf échantillon client : P001 - Maison - Rez de chaussée - Entrée - Mur(s) A Enduit Plâtreux projeté		Réf échantillon ITGA : IT152311-4976 Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distingues par M. (3) Analyse : CTP (4)
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT Réf échantillon client : P002 - Maison - Rez de chaussée - Entrée - Plafond Enduit projeté		Réf échantillon ITGA : IT152311-4977 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc	META (A) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyse : RMT (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 1/8

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0223-27733 EN DATE DU 23/11/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT Réf échantillon client : P003 - Maison - Rez de chaussée - Entrée - Mur(s) B Colle plinthes		Réf échantillon ITGA : IT152311-4978 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible quantité	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle beige + Couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	META (A) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : BJL (5)
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT Réf échantillon client : P004 - Maison - Rez de chaussée - Entrée - Plancher Colle carrelage		Réf échantillon ITGA : IT152311-4979 Description ITGA : Peinture en faible quantité / Carrelage / Colle grise hétérogène	
▶ Peinture en faible quantité non séparable + Colle grise hétérogène	META (A) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) /	Analyste : CTP (5)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT Réf échantillon client : P005 - Maison - Rez de chaussée - Entrée - Plancher Dalle béton		Réf échantillon ITGA : IT152311-4980 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
▶ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT Réf échantillon client : P006 - Maison - Rez de chaussée - garage coté chaufferie - Conduit(s) de fluide mur A Calorifugeage		Réf échantillon ITGA : IT152311-4981 Description ITGA : Matériau fibreux multicolore	
▶ Matériau fibreux multicolore	MOLP le 22/11/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLD
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT Réf échantillon client : P007 - Maison - Rez de chaussée - garage coté chaufferie - Conduit(s) de fumées chaufferie A Enduit		Réf échantillon ITGA : IT152311-4982 Description ITGA : Peinture en faible quantité / Enduit beige	
▶ Peinture en faible quantité non séparable + Enduit beige	META (A) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 2/8

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0223-27733 EN DATE DU 23/11/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT Réf échantillon client : P008 - Maison - Rez de chaussée - garage coté chaufferie - Plancher Dalle béton	Réf échantillon ITGA : IT152311-4983 Description ITGA :	Peinture en faible quantité / Matériau compact gris hétérogène	
Peinture en faible quantité non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (5)
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT Réf échantillon client : P009 - Maison - Rez de chaussée - Local adjacent garage - Conduit(s) de fluide mur A Calorifugeage blanc	Réf échantillon ITGA : IT152311-4984 Description ITGA :	Poussières en faible quantité / Matériau fibreux blanc	
Poussières en faible quantité	---	Non analysé	
Matériau fibreux blanc	MOLP le 22/11/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLD
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT Réf échantillon client : P010 - Maison - Rez de chaussée - Montée d'escalier - Mur(s) C Colle plinthes	Réf échantillon ITGA : IT152311-4985 Description ITGA :	Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible quantité	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige + Couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	META (A) le 23/11/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (5)
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT Réf échantillon client : P011 - Maison - Rez de chaussée - Pièce Principale - Mur(s) e Bande calicot	Réf échantillon ITGA : IT152311-4986 Description ITGA :	Peinture en faible quantité en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux beige en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
Peinture en faible quantité en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 3/8

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0223-27733 EN DATE DU 23/11/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux – Maison Assistantes Maternelle – 60640 GOLANCOURT		Réf échantillon ITGA : IT152311-4987	
Réf échantillon client : P012 - Maison – Rez de chaussée – Local ECS - Mur(s) C Enduit rebouchage		Description ITGA : Enduit compact gris hétérogène	
▸ Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux – Maison Assistantes Maternelle – 60640 GOLANCOURT		Réf échantillon ITGA : IT152311-4988	
Réf échantillon client : P013 - Maison – 1er étage – Palier - Sol Colle grise et blanche fixation barre de seuil		Description ITGA : Colle polymère blanche / Matériau gris en faible quantité / Matériau beige en faible quantité	
▸ Colle polymère blanche + Matériau gris en faible quantité non séparable + Matériau beige en faible quantité non séparable	META (B) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (5)
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux – Maison Assistantes Maternelle – 60640 GOLANCOURT		Réf échantillon ITGA : IT152311-4989	
Réf échantillon client : P014 - Maison – 1er étage – Palier - Sol Dalles de sol blanches		Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Matériau gris en faible quantité	
▸ Dalle dure cassante beige	META (B) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : DIA
▸ Colle bitumineuse noire + Matériau gris en faible quantité non séparable	MOLP le 22/11/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FLD (5)
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux – Maison Assistantes Maternelle – 60640 GOLANCOURT		Réf échantillon ITGA : IT152311-4990	
Réf échantillon client : P015 - Maison – 1er étage – Palier - Sol Dalles de sol noires		Description ITGA : Dalle dure cassante noire / Colle bitumineuse noire en faible quantité	
▸ Dalle dure cassante noire	META (B) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : DIA
▸ Colle bitumineuse noire en faible quantité	MOLP le 22/11/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FLD

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 4/8

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0223-27733 EN DATE DU 23/11/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT Réf échantillon client : P016 - Maison - 1er étage - Palier - Mur(s) A Enduit Plâtreux projeté		Réf échantillon ITGA : IT152311-4991 Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT Réf échantillon client : P017 - Maison - 1er étage - Pièce Principale - Plancher Ciment réagréage		Réf échantillon ITGA : IT152311-4992 Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Ragréage gris hétérogène	
Colle bitumineuse noire + Ragréage gris hétérogène non séparable	MOLP le 22/11/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FLD (5)
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT Réf échantillon client : P018 - Maison - 1er étage - Cuisine - Plancher Colle carrelage		Réf échantillon ITGA : IT152311-4993 Description ITGA : Joint cassant gris en faible quantité / Carrelage / Colle grise / Matériau compact gris en faible quantité hétérogène	
Joint cassant gris en faible quantité non séparable + Colle grise + Matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable	META (A) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (5)
Carrelage		Non analysé	
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT Réf échantillon client : P019 - Maison - 1er étage - Cuisine - Mur(s) C Colle plâtreuse		Réf échantillon ITGA : IT152311-4994 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible quantité	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige + Couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	META (A) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NBI (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 5/8

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0223-27733 EN DATE DU 23/11/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux – Maison Assistantes Maternelle – 60640 GOLANCOURT Réf échantillon client : P020 - Maison – 1er étage – Cuisine - Mur(s) B Colle plinthes		Réf échantillon ITGA : IT152311-4995 Description ITGA :	Peinture en faible quantité / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige	META (A) le 23/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : EWB
▸ Peinture en faible quantité non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 23/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (5)
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux – Maison Assistantes Maternelle – 60640 GOLANCOURT Réf échantillon client : P021 - Maison – 1er étage – Cuisine - Mur(s) C Joint silicone		Réf échantillon ITGA : IT152311-4996 Description ITGA :	Matériau souple incolore / Matériau gris en faible quantité
▸ Matériau souple incolore non séparable + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (B) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (5)
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux – Maison Assistantes Maternelle – 60640 GOLANCOURT Réf échantillon client : P022 - Maison – 1er étage – Cuisine - Plafond Colle dalles		Réf échantillon ITGA : IT152311-4997 Description ITGA :	Colle beige / Matériau en polystyrène blanc / Matériau blanc en faible quantité
▸ Colle beige + Matériau blanc en faible quantité non séparable	META (A) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (5)
Matériau en polystyrène blanc	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux – Maison Assistantes Maternelle – 60640 GOLANCOURT Réf échantillon client : P023 - Maison – 1er étage – Dégagement - Sol Dalles de sol beiges		Réf échantillon ITGA : IT152311-4998 Description ITGA :	Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Matériau gris en faible quantité
▸ Dalle dure cassante beige	META (B) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : DIA
▸ Colle bitumineuse noire + Matériau gris en faible quantité non séparable	MOLP le 22/11/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FLD (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 6/8

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0223-27733 EN DATE DU 23/11/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT Réf échantillon client : P024 - Maison - 1er étage - Dégagement - Plafond Colle dalles		Réf échantillon ITGA : IT152311-4999 Description ITGA : Colle beige en faible quantité / Matériau en polystyrène blanc	
▶ Colle beige en faible quantité Matériau en polystyrène blanc	META (A) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2 ---	Amiante non détecté (2) / - Non analysé	Analyste : EWB
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT Réf échantillon client : P025 - Maison - 1er étage - Salle de bains - Mur(s) B Colle faïence		Réf échantillon ITGA : IT152311-5000 Description ITGA : Peinture en faible quantité / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche avec couche en papier	
▶ Peinture en faible quantité non séparable + Colle beige + Couche plâtreuse blanche avec couche en papier non séparable Carrelage	META (A) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2 ---	Amiante non détecté (2) / - Non analysé	Analyste : RMT (5)
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT Réf échantillon client : P026 - Maison - 1er étage - Salle de bains - Mur(s) D Joint silicone		Réf échantillon ITGA : IT152311-5001 Description ITGA : Matériau souple blanc / Matériau beige en faible quantité	
▶ Matériau souple blanc + Matériau beige en faible quantité non séparable	META (B) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DIA (5)
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT Réf échantillon client : P027 - Maison - Rez de chaussée - EXTERIEUR HABITATION - Façade avant Enduit projeté		Réf échantillon ITGA : IT152311-5002 Description ITGA : Peinture / Enduit compact blanc / Matériau compact gris hétérogène	
▶ Peinture non séparable + Enduit compact blanc non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 7/8

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0223-27733 EN DATE DU 23/11/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux – Maison Assistantes Maternelle – 60640 GOLANCOURT Réf échantillon client : P028 - Maison – Rez de chaussée – garage coté chaufferie - Conduit(s) de fumées Enduit ciment	Réf échantillon ITGA : IT152311-5003 Description ITGA : Enduit compact gris hétérogène		
Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux – Maison Assistantes Maternelle – 60640 GOLANCOURT Réf échantillon client : P029 - Maison – 1er étage – Pièce Principale - Mur(s) B Enduit	Réf échantillon ITGA : IT152311-5004 Description ITGA : Peinture en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau marron en faible quantité en vrac		
Peinture en faible quantité non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau marron en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (4)
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux – Maison Assistantes Maternelle – 60640 GOLANCOURT Réf échantillon client : P030 - Maison – 2ème étage – Combles Sous pentes de toiture - Conduit(s) Enduit ciment	Réf échantillon ITGA : IT152311-5005 Description ITGA : Peinture en faible quantité / Enduit compact gris hétérogène		
Peinture en faible quantité non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (5)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure 0,2 micromètre (µm).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).

(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Hélène COCHET Analyste


La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 8/8

Planche photographique

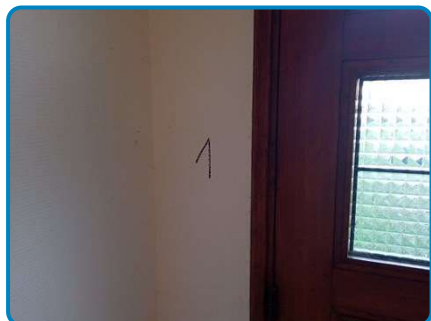


PRLV n° 1 sur Mur(s) A Enduit Platreux projeté / A




PRLV n° 2 sur Plafond Enduit projeté



PRLV n° 3 sur Mur(s) B Plaques de plâtre / B

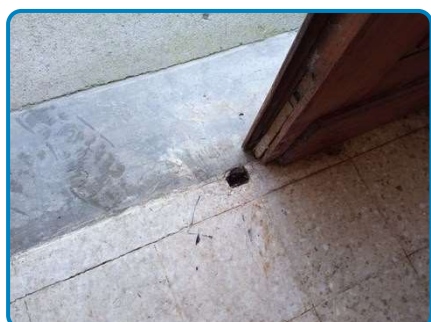

PRLV n° 4 sur Plancher Colle carrelage

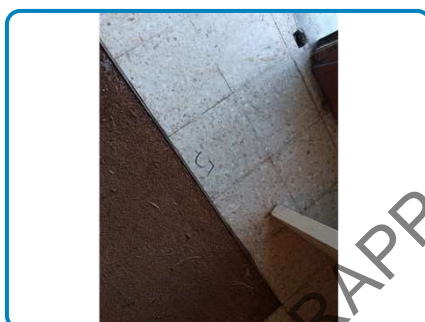

PRLV n° 5 sur Plancher Dalle béton



PRLV n° 6 sur Conduit(s) de fluide mur A Calorifugeage / A



PRLV n° 7 sur Conduit(s) de fumées chaufferie A Enduit rebouchage blanc / A



PRLV n° 8 sur Plancher Dalle béton



PRLV n° 28 sur Conduit(s) de fumées Enduit ciment / Conduit



PRLV n° 9 sur Conduit(s) de fluide mur A Calorifugeage blanc / A



PRLV n° 10 sur Mur(s) C Colle plinthes / B




PRLV n° 11 sur Mur(s) e Bande calicot / E



PRLV n° 12 sur Mur(s) C Enduit rebouchage / C




PRLV n° 27 sur Façade avant Enduit projeté / Façade ava

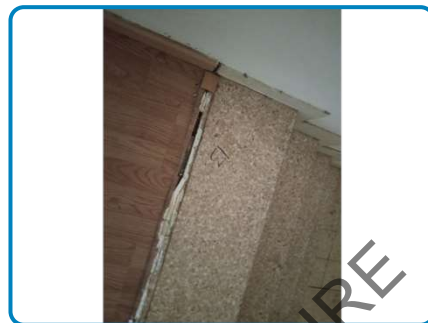


PRLV n° 13 sur Sol Colle grise et blanche fixation barre de seuil



PRLV n° 14 sur Sol Dalles de sol blanches
PRLV n° 15 sur Sol Dalles de sol noires

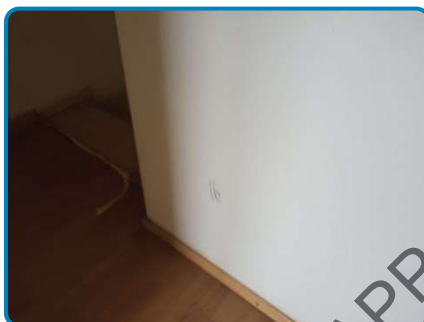


PRLV n° 16 sur Mur(s) A Enduit Platreux projeté / A

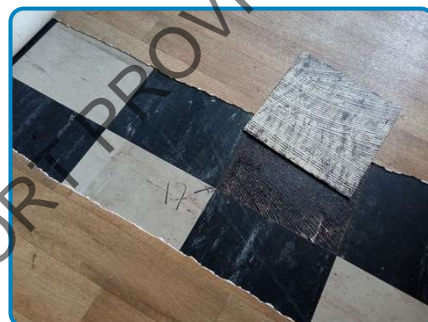

PRLV n° 17 sur Plancher Ciment réagréage




PRLV n° 29 sur Mur(s) B Enduit / B

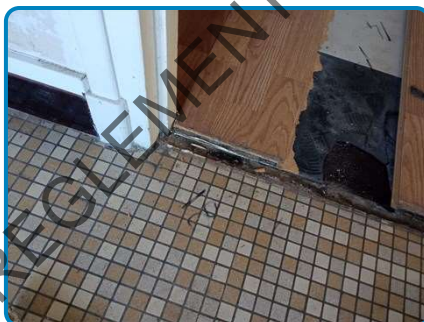

PRLV n° 18 sur Plancher Colle carrelage



PRLV n° 19 sur Mur(s) C Colle faïence / C

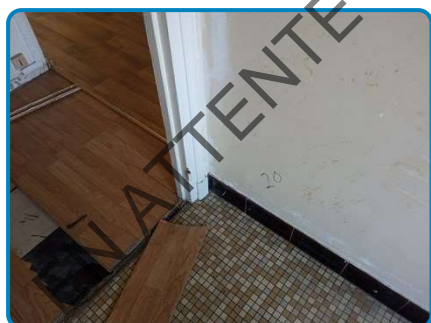


PRLV n° 20 sur Mur(s) B Colle plinthes / B



PRLV n° 21 sur Mur(s) D Joint silicone / D




PRLV n° 22 sur Plafond Colle dalles

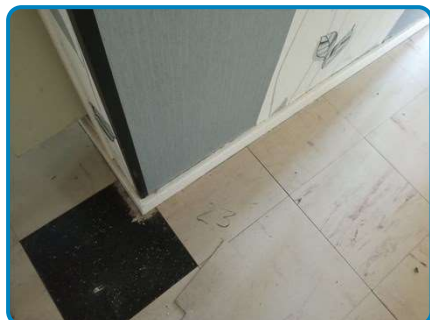

PRLV n° 23 sur Sol Dalles de sol beiges



PRLV n° 24 sur Plafond Colle dalles

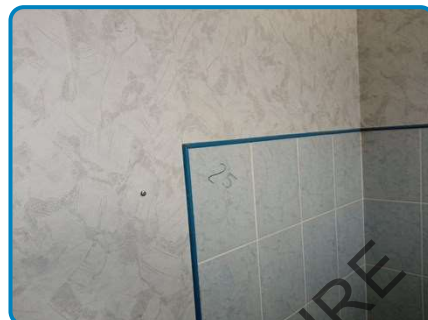




PRLV n° 25 sur Mur(s) B Colle faïence / B











PRLV n° 26 sur Mur(s) D Joint silicone / D




PRLV n° 30 sur Conduit(s) Enduit ciment / Conduit

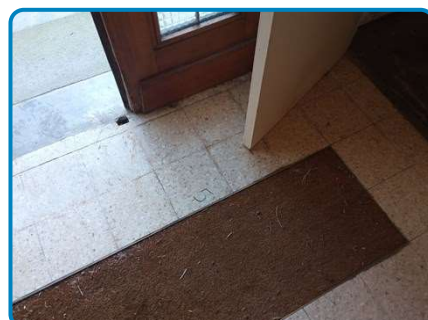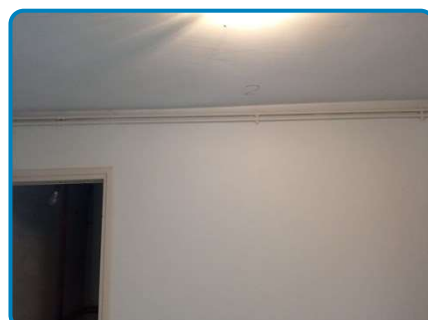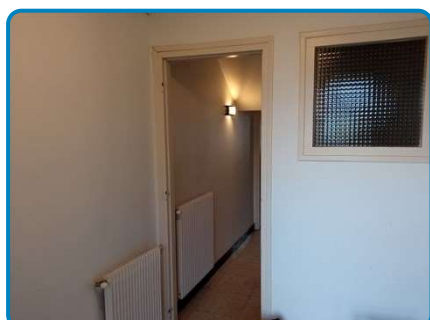

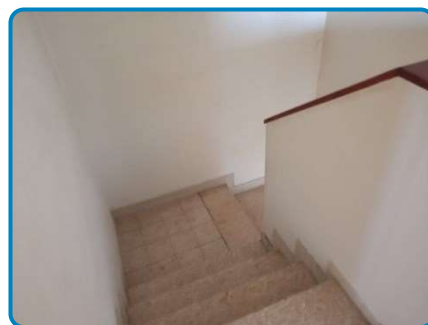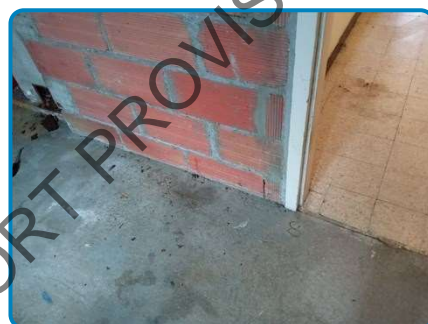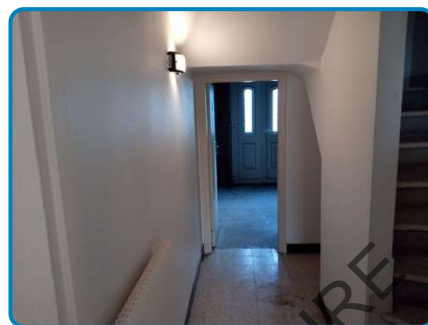

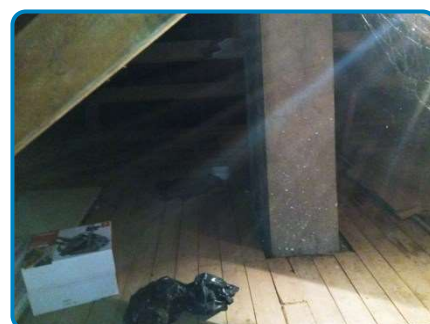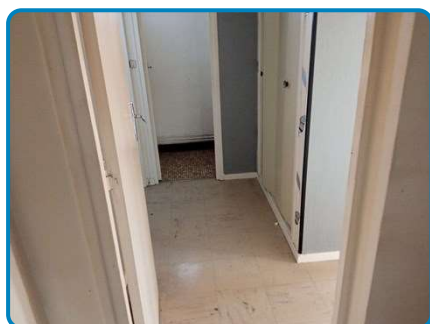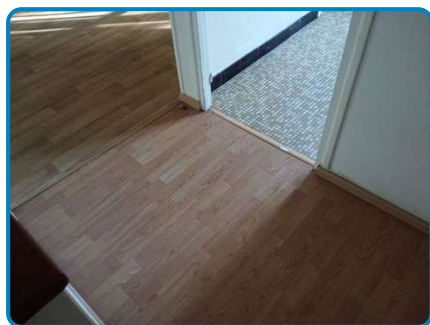

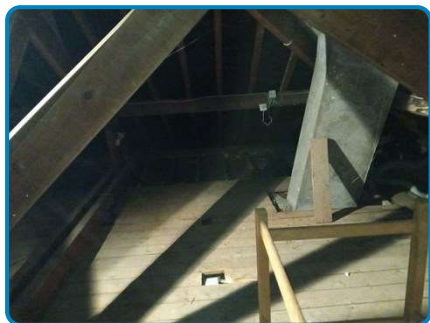

EN ATTENTE DE REGLEMENT RAPPORT PROVISOIRE

Attestation d'assurance

Certifications

RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE

AXA

AXA France IARD, atteste que :
 NEWTON
 Madame Julie MAUPIN-EDANGE
 20 rue du Tuquet
 02300 VILLEQUIER-AUMONT

Bénéficiaire du contrat n° 1075583504 souscrit par AGENDA France garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat.

Ce contrat a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n° 2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n° 2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R 271 - 1 à R 272 - 4 et R 271 - 4 à R 271 - 6 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes ultérieurs ;
- Garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir à l'égard d'autrui du fait des activités, telles que déclarées aux Dispositions Particulières, à savoir :

Sont couvertes les activités suivantes, sous réserve que les compétences de l'Assuré, personne physique ou que les compétences de ses diagnostiqueurs salariés aient été certifiées par un organisme accrédité, lorsque la réglementation l'exige, et ce pour l'ensemble des diagnostics suivants :

- Représentation des A et B, constitution de DAPP et de DTA, évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, repérage liste C, repérage avant travaux immeubles bâtis, examen visuel après travaux de retrait de matériaux et produits contenant de l'amiante, dans tout type de bâtiment et plus généralement dans tout type d'ouvrage ou d'équipement de génie civil. (Amiante AVEC mention)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP), parties privatives et parties communes
- Représentation de plomb avant travaux
- Représentation de plomb avant travaux
- Etat de l'installation intérieure d'électricité, parties privatives et parties communes
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Diagnostic de performance énergétique (DPE) tous types de bâtiments
- Diagnostic de performance énergétique (DPE) avant et après travaux
- Matérialisation des attestations de prise en compte de la réglementation thermique pour les maisons individuelles ou accolées
- Constat et étude en rénovation énergétique sans mise en oeuvre des préconisations
- Audit énergétique réglementaire de bâtiments ne comportant qu'un seul logement
- Mesurage loi Carrez
- Mesurage surface habitable - Relevé de surfaces
- Plans et croquis à l'exclusion de toute activité de conception
- Relevé de cotes pour la réalisation de plans d'évacuation et constat visuel de présence ou non de portes coupe-feu dans les immeubles d'habitation
- Fiche de renseignement immobilier PERVAL / Bien
- Etat des lieux locaux
- Constat logement décent
- Prêt conventionné - Prêt à taux zéro - Normes d'habitabilité
- Détermination de la concentration en plomb dans l'eau des canalisations
- Installation de détecteurs de fumée
- Diagnostic télétravail
- Diagnostic de performance numérique
- Attestation d'exposition des formations argileuses au phénomène de mouvement de terrain différentiel
- Etat des nuisances sonores aériennes (ENSA)
- Etat des risques et pollutions (ERP)
- Constat sécurité piscine
- Millimètres de copropriété, tantômes de charges
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Assainissement autonome
- Assainissement collectif
- Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habitation ou recevant du public

Garantie RC Professionnelle : 3 000 000 € par sinistre et par année d'assurance et par Cabinet.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.
 Sa validité cesse pour les risques visés à l'étranger dès lors que l'Assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable pour la période du 1^{er} avril 2023 au 31^{er} janvier 2024, sous réserve du paiement de la prime et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Etablie à PARIS LA DEFENSE, le 14 mars 2023, pour la Société AXA

AXA France IARD SA
 Société anonyme au capital de 214 799 032 Euros
 Siège social : 311, Terrasse de l'Esplanade - 92177 Nanterre Cedex 752 037 460 R.C.S. Nanterre
 Entreprise régie par le Code des Assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 752 037 460
 Opérations d'assurances autorisées de TVA - art. 263 C-CC - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/1

CERTIFIE

abcidia
 opérateur de diagnostics immobiliers

La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

SPINELLI Frédéric
 sous le numéro 13-364

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

<input checked="" type="checkbox"/>	Amiante sans mention	Prise d'effet : 23/05/2022	Validité : 22/05/2029
Année du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.			
<input checked="" type="checkbox"/>	Amiante avec mention	Prise d'effet : 23/05/2022	Validité : 22/05/2029
Année du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.			
<input checked="" type="checkbox"/>	DPE individuel	Prise d'effet : 16/11/2018	Validité : 15/11/2025
Année du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.			
<input checked="" type="checkbox"/>	DPE Tous types de bâtiments	Prise d'effet : 16/11/2018	Validité : 15/11/2025
Année du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.			
<input checked="" type="checkbox"/>	Gaz	Prise d'effet : 11/10/2018	Validité : 10/10/2025
Année du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.			
<input checked="" type="checkbox"/>	CREP	Prise d'effet : 11/10/2018	Validité : 10/10/2025
Année du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.			
<input checked="" type="checkbox"/>	Electricité	Prise d'effet : 11/10/2018	Validité : 10/10/2025
Année du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.			

13-364 - v6 - 18/10/2023

cofrat
 CERTIFICATION
 de l'habitation

Véronique DELMAY
 Gestionnaire des certifications

Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
 Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N°60011
 102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 01 30 85 25 71
 www.abcidia-certification.fr - contact@abcidia-certification.fr

ENR20 V10 du 02 décembre 2022

Attestation d'indépendance

« Je soussigné Julie MAUPIN-EDANGE, Gérant du Cabinet AGENDA, atteste sur l'honneur, conformément aux articles L271-6 et R271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation :

- Disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires aux prestations ;
- Que les personnes chargées de la réalisation des états, constats et diagnostics disposent des moyens et des certifications requises leur permettant de mener à bien leur mission ;
- Avoir souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de notre responsabilité en raison de nos interventions ;
- N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à notre impartialité et à notre indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à nous, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il nous est demandé de réaliser la présente mission, et notamment :
 - N'accorder, directement ou indirectement, à l'entité visée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 qui intervient pour la vente ou la location du bien objet de la présente mission, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit ;
 - Ne recevoir, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte la présente mission, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. »
